

Baustellendokumentation Perlenkette hinteres Leimental

Bauzeit: 23.08.2021 - 15.09.2021

	<p>Chöpfliweiher: (Standort 1, Bättwil)</p> <p><i>Werner Götz schlägt die Pfosten für die Baueingabe des Projekts ein.</i></p> <p><i>Foto: 22.04.2020</i></p>
	<p>Chöpfliweiher: (Standort 1, Bättwil)</p> <p><i>Startsitzung mit Ariane Hausammann und Vertretern aus der Gemeinde Witterswil.</i></p> <p><i>Foto: 23.08.2021</i></p>
	<p>Chöpfliweiher: (Standort 1, Bättwil)</p> <p><i>Franziska Studer (Büro Götz) erledigt die Finisharbeiten am Weiher substrat und den Landlebensräumen.</i></p> <p><i>Foto: 07.09.2021</i></p>



Grienackerweiher:
(Standort 2, Bättwil)

Niklaus Tanner (Büro Götz) schält mit Hilfe des Baggers die Vegetation aus der bestehenden Grube ab.

Foto: 24.08.2021



Grienackerweiher:
(Standort 2, Bättwil)

Alte Glasflaschen, Tonscherben und Metallreste werden in einer Mulde zwischengelagert und fachgerecht entsorgt.

Foto: 24.08.2021



Grienackerweiher:
(Standort 2, Bättwil)

Der frisch gebaute Weiher wartet darauf, mit Regenwasser gefüllt zu werden.

Foto: 02.09.2021

**Rütiweiher:**

(Standort 3, Witterswil)

Wurzelstöcke werden für die Geländemodellierung ausgegraben und später als Landlebensräume wieder eingebaut.

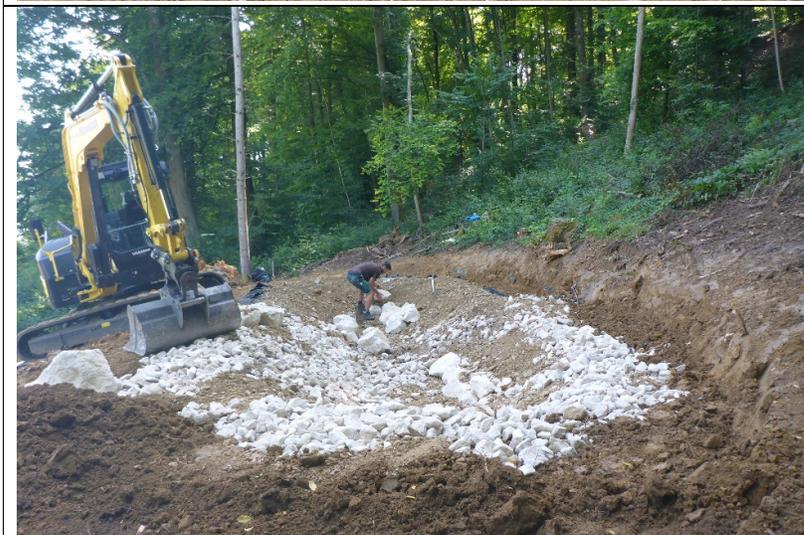
Foto: 25.08.2021

**Rütiweiher:**

(Standort 3, Witterswil)

Die zu bestellende Folienfläche wird vor Ort ausgemessen.

Foto: 26.08.2021

**Rütiweiher:**

(Standort 3, Witterswil)

Steile Uferpartien werden mit groben Kalksteinblöcken gesichert und mit Gelbkies hinterfüllt.

Foto: 08.09.2021

**Hollenweiher:**

(Standort 4, Witterswil)

Die Aushubarbeiten für den Weiherbau sind abgeschlossen.

Foto: 30.08.2021

**Hollenweiher:**

(Standort 4, Witterswil)

Zum Schutz der Kautschukfolie wird ein dickes Vlies (800g/m²) ausgerollt. Über der Folie liegt ein dünneres Schutzvlies (200g/m²)

Foto: 09.09.2021

**Hollenweiher:**

(Standort 4, Witterswil)

Die Steinhaufen am Weiherrand sind in die Erde eingegraben und mit Löss und Wurzelstöcken aus der Geländemodellierung ergänzt.

Foto: 09.09.2021



Reckholzweiher:
(Standort 5, Witterswil)

Mit Hilfe eines Nivelliergeräts werden die Höhenverhältnisse laufend gemessen und angepasst.

Foto: 31.08.2021



Reckholzweiher:
(Standort 5, Witterswil)

Eine Erdkröte beobachtet uns beim Weiherbau.

Foto: 31.08.2021



Reckholzweiher:
(Standort 5, Witterswil)

Der Weiher ist fertiggestellt. Das Weihersubstrat besteht aus Lehm, Gelbkies, Kalkschroppen und gröberem Kalksteinen.

Foto: 14.09.2021

**Schalienweiher:**

(Standort 6, Witterswil)

Die Kautschukfolie und die Schutzvliese sind ausgelegt.

Foto: 14.09.2021

**Schalienweiher:**

(Standort 6, Witterswil)

Die Abdichtung wird vorsichtig mit ca. 30-40cm Gelbkies bedeckt.

Foto: 14.09.2021

**Schalienweiher:**

(Standort 6, Witterswil)

Nach rund 3.5 Wochen ist der Bau der Weiherkette im Leimental abgeschlossen.

Foto: 15.09.2021

Liestal, 13. Oktober 2020, fs, nt, wg
